

RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Hősök kertje rendezvényter felújítása

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-86-4-17 kódszámú, Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület – Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása című felhívás alapján Tiszanána Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2018.10.28-án 1952139079 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

A Kedvezményezett a támogatási kérelem alapján 6.936.446, - Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

1., Pénzügyi beszámoló

A projekt tervezett forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	8.424.998,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	7.301.524,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	1.123.474,- Ft
Támogatás összege:	6.936.446,- Ft
Önerő:	1.488.552,- Ft
Saját forrás:	1.488.552,- Ft
Egyéb támogatás:	0.- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	1.123.474,- Ft

A projekt megvalósulás szerinti forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	8.424.998,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	7.301.524,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	1.123.474,- Ft
Támogatás összege:	6.936.446,- Ft
Önerő:	1.488.552,- Ft
Saját forrás:	1.488.552,- Ft
Egyéb támogatás:	0.- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	1.123.474,- Ft



Tiszanána Község Önkormányzata 3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

A fenti költségtáblák összehasonlításából megállapítható, hogy pénzügyi szempontból a projekt bármintemű változtatás nélkül, teljes tartalmában, az első mérőföldköben vállaltak szerint megvalósult.

A támogatott költségek, költség sorok szerinti változtatás nélkül valósultak meg. Az Önkormányzat, mint Kedvezményezett a szükséges önerőt biztosította a projekt megvalósítása érdekében.

2., Szakmai beszámoló

A kivitelező, Tiszanánai Építőipari Start Szociális Szövetkezet kiválasztása után megkezdte a felújítási munkálatokat. A műszaki ellenőr Király László egyéni vállalkozó lett. Az eszközbeszerzés nyertese az Enter-Nána Nonprofit Kft. A nyilvánosság projektelemeit A Turizmus Népszerűsítése az Ifjúság körében Alapítvány végezte, a rendezvényi reprezentációt az Enter-Nána Nonprofit Kft látta el. A Tisza-Tarna-Rima- Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület által kiírt Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása című felhívás keretében elnyert, Hősök kertje rendezvénytér felújítása projekt (1952139079 projektazonosító számú) megvalósítása során elvégeztük a hátsó kerítés teljes bontását, a kerítéslábazat bontását 40 méteren. A kerítés előlő részén 15 méter kerítést kellett elbontanunk, szintén az erős és magas lábazattal együtt.

A következő munkafolyamat a gyalogsétány kijelölése, tükörkésztés, 20 m² -en, a tükörkésztést követően a kőburkolat alá kavicságyat és homokot terítettünk. A sétány oldalát betonkerti szegővel láttuk el 17 méter hosszan. A sétány melletti 1000 m²-en füvesítést végeztünk, melynek megelőző munkája a talajelőkészítése volt a költségvetésben leírtak szerint. A magágy készítését követően a fűmag vetése megtörtént, melyet lehangereztünk. Az eszközbeszerzés megtörtént, a hangfalak leszállításra kerültek. Az építési feladatok folytatódtak, a növények betelepítésre kerültek (egy- és többnyári növények). Beépítésre kerültek az 1 db információs tábla, a 2 db pergola, az 1 db esőbeálló, a 3 db virágláda, a 4 db szemeteskuka, az 5 db kerékpártároló és a 3 db egybeépített rönkasztal és rönkpad.

3., A projekt eredményessége és hatékonysága

Vállalt indikátor:

Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	4	8

Megvalósult indikátor:

Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	4	6



Tiszanána Község Önkormányzata 3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

Eredmények leírása:

A település központi parkja teljesen megújult, a projektben vállalt feladatok teljesültek, a különböző eszközök beszerzésre kerültek.

Hatékonyság leírása:

Társadalmi célú: A beruházás során az önkéntesség fejlesztése és az együttműködések erősítése kiemelt szempont volt. A beruházás folyamán kiemelt szerepet kapott a helyi értékek kiemelése és bemutatása, ezenkívül pedig a természeti környezet védelme és megóvása egyaránt.


Gazdasági célú: A szálláshelyeken a vendégéjszakák számának növekedése, a szolgáltatóknál az idegenforgalmi bevételek, az Önkormányzatnál pedig az adóbevételek növekedése.

Környezeti célú: a település ismertsége nőtt, az ökoszemlélet terjedése szintén fejlődött, a természeti és társadalmi környezet megóvása fokozódott.

4., Fotódokumentáció



Tiszanána Község Önkormányzata
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

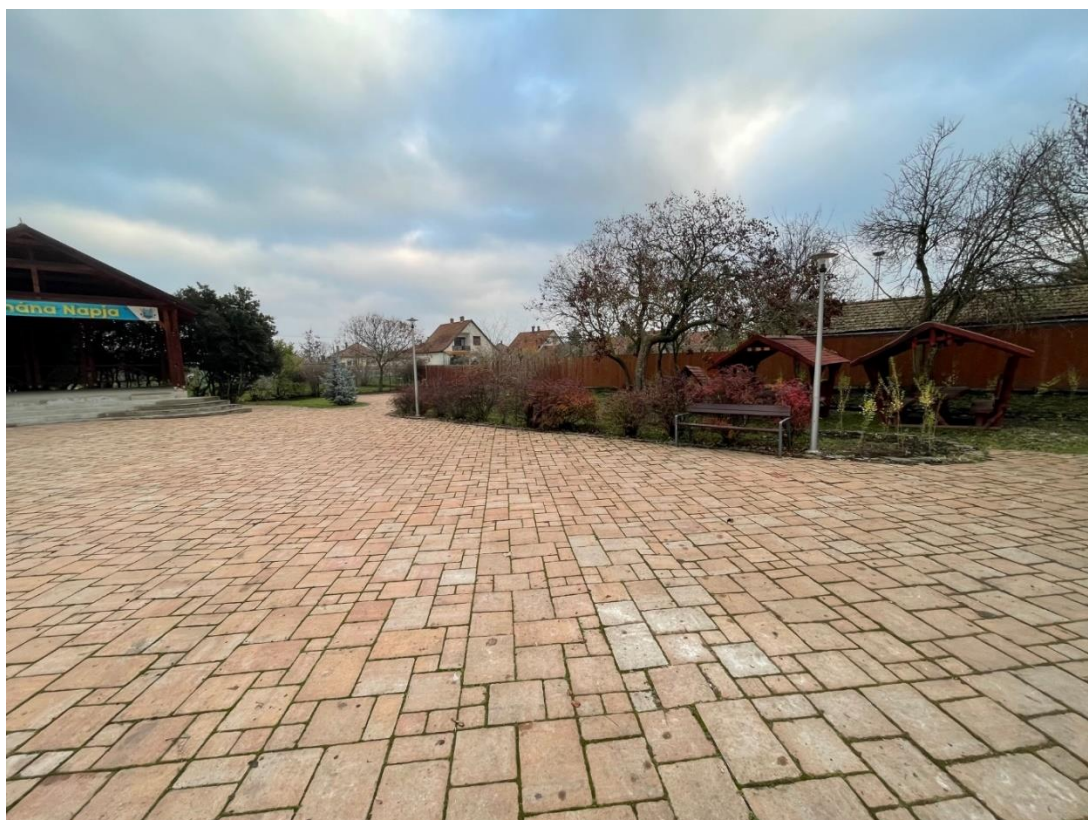

Tiszanána Község Önkormányzata
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.



Tiszanána Község Önkormányzata
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.



Tiszanána Község Önkormányzata
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.



Tiszanána Község Önkormányzata
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.



Tiszanána Község Önkormányzata
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.



Kelt: Tiszanána, 2023.11.10.

Dr. Tóth József
polgármester
sk.

